


ID	Testo1	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	Costo	Anno 1												
								Mese -1	1° trimestre Mese 1	Mese 2	Mese 3	2° trimestre Mese 4	Mese 5	Mese 6	3° trimestre Mese 7	Mese 8	Mese 9	4° trimestre Mese 10		
1		Scuola Rapisardi - Canicatti	270 giorni	dom 04/01/26	mar 22/09/26		€ 878.343,49													
2	F1	Allestimento cantiere logistico	15 giorni	dom 04/01/26	dom 18/01/26		€ 0,00		Allestimento cantiere logistico											
3	F1.1	Pulizia aree	2 giorni	dom 04/01/26	lun 05/01/26		€ 0,00													
4	F1.2	Sistemazione baracche	5 giorni	mar 06/01/26	sab 10/01/26	3	€ 0,00													
5	F1.3	Formazione impianti	6 giorni	dom 11/01/26	ven 16/01/26	4	€ 0,00													
6	F1.4	Installazione segnaletica di deviazione traffico su Via Rosolino Pilo	2 giorni	sab 17/01/26	dom 18/01/26	5	€ 0,00													
7	F2	Rimozione e demolizioni	50 giorni	lun 19/01/26	lun 09/03/26		€ 13.356,92			Rimozione e demolizioni										
8	F2.1	Piano seminterrato	10 giorni	lun 19/01/26	mer 28/01/26	6	€ 1.282,43													
9	F2.2	Piano rialzato	30 giorni	lun 19/01/26	mar 17/02/26	6	€ 7.927,19													
10	F2.3	Piano primo	20 giorni	mer 18/02/26	lun 09/03/26	9	€ 4.147,30													
11	F3	Piano seminterrato: Interventi edilizi - impianti	135 giorni	gio 29/01/26	ven 12/06/26		€ 111.606,39			Piano seminterrato: Interventi edilizi - impianti										
12	F3.1	Opere edilizie: prima fase	20 giorni	gio 29/01/26	mar 17/02/26	8	€ 71,12													
13	F3.2	Impianti: opere murarie	15 giorni	mer 18/02/26	mer 04/03/26	12	€ 9.945,18													
14	F3.3	Formazione impianto elettrico	20 giorni	gio 05/03/26	mar 24/03/26	13	€ 39.780,71													
15	F3.4	Formazione impianto idrico sanitario	15 giorni	mer 25/03/26	mer 08/04/26	14	€ 2.578,69													
16	F3.5	Formazione impianto idrico antincendio	10 giorni	gio 09/04/26	sab 18/04/26	15	€ 1.943,00													
17	F3.6	Opere edilizie: completamenti	15 giorni	dom 19/04/26	dom 03/05/26	16	€ 11.250,43													
18	F3.7	Attivazione caldaia e posa radiatori	10 giorni	lun 04/05/26	mer 13/05/26	17	€ 14.549,62													
19	F3.8	Impianto di allarme incendi	10 giorni	gio 14/05/26	sab 23/05/26	18	€ 6.527,13													
20	F3.9	Opere edilizie di finitura	15 giorni	dom 24/05/26	dom 07/06/26	19	€ 3.237,46													
21	F3.10	Posa infissi interni e tinteggiature	5 giorni	lun 08/06/26	ven 12/06/26	20	€ 21.723,05													
22	F4	Piano rialzato: Interventi edilizi - impianti	195 giorni	mer 18/02/26	lun 31/08/26		€ 545.011,87			Piano rialzato: Interventi edilizi - impianti										
23	F4.1	Opere edilizie: prima fase	30 giorni	mer 18/02/26	gio 19/03/26	12	€ 3.358,44													
24	F4.2	Impianti: opere murarie	20 giorni	ven 20/03/26	mer 08/04/26	23	€ 51.473,32													
25	F4.3	Formazione impianto elettrico	30 giorni	gio 09/04/26	ven 08/05/26	24	€ 188.315,37													
26	F4.4	Formazione impianto idrico sanitario	15 giorni	sab 09/05/26	sab 23/05/26	25	€ 22.123,74													
27	F4.5	Formazione impianto idrico antincendio	15 giorni	dom 24/05/26	dom 07/06/26	26	€ 65.122,35													
28	F4.6	Opere edilizie: completamenti	25 giorni	lun 08/06/26	gio 02/07/26	27	€ 4.730,25													
29	F4.7	Posa radiatori	10 giorni	ven 03/07/26	dom 12/07/26	28	€ 17.816,43													
30	F4.8	Impianto di allarme incendi	15 giorni	lun 13/07/26	lun 27/07/26	29	€ 27.292,83													
31	F4.9	Opere edilizie di finitura	25 giorni	mar 28/07/26	ven 21/08/26	30	€ 23.986,85													
32	F4.10	Posa infissi interni e tinteggiature	10 giorni	sab 22/08/26	lun 31/08/26	31	€ 140.792,29													
33	F5	Piano primo: Interventi edilizi - impianti	131 giorni	ven 20/03/26	mar 28/07/26		€ 208.368,31			Piano primo: Interventi edilizi - impianti										
34	F5.1	Opere edilizie: prima fase	20 giorni	ven 20/03/26	mer 08/04/26	23	€ 2.993,93													
35	F5.2	Impianti: opere murarie	15 giorni	gio 09/04/26	gio 23/04/26	34	€ 9.424,42													
36	F5.3	Formazione impianto elettrico	20 giorni	ven 24/04/26	mer 13/05/26	35	€ 37.697,69													
37	F5.4	Formazione impianto idrico sanitario	10 giorni	gio 14/05/26	sab 23/05/26	36	€ 18.442,30													
38	F5.5	Formazione impianto idrico antincendio	10 giorni	dom 24/05/26	mar 02/06/26	37	€ 14.190,01													
39	F5.6	Opere edilizie: completamenti	15 giorni	mer 03/06/26	mer 17/06/26	38	€ 617,17													
40	F5.7	Posa radiatori	8 giorni	gio 18/06/26	gio 25/06/26	39	€ 11.996,10													
41	F5.8	Impianto di allarme incendi	10 giorni	ven 26/06/26	dom 05/07/26	40	€ 5.121,61													
42	F5.9	Opere edilizie di finitura	15 giorni	lun 06/07/26	lun 20/07/26	41	€ 10.146,84													
43	F5.10	Posa infissi interni e tinteggiature	8 giorni	mar 21/07/26	mar 28/07/26	42	€ 97.738,24													
44	F6	Smontaggio cantiere logistico	22 giorni	mar 01/09/26	mar 22/09/26		€ 0,00										Smontaggio cantiere logistico			
45	F11.1	Smontaggio impianti	4 giorni	mar 01/09/26	ven 04/09/26	32	€ 0,00													
46	F11.2	Smontaggio baracche	5 giorni	sab 05/09/26	mer 09/09/26	45	€ 0,00													
47	F11.3	Rimozione segnaletica	3 giorni	gio 10/09/26	sab 12/09/26	46	€ 0,00													
48	F11.4	Ripristino aree	10 giorni	dom 13/09/26	mar 22/09/26	47	€ 0,00													

Progetto: Rapisardi
Data: lun 03/11/25

Attività



Divisione


Cardine



Riepilogo



Riepilogo progetto

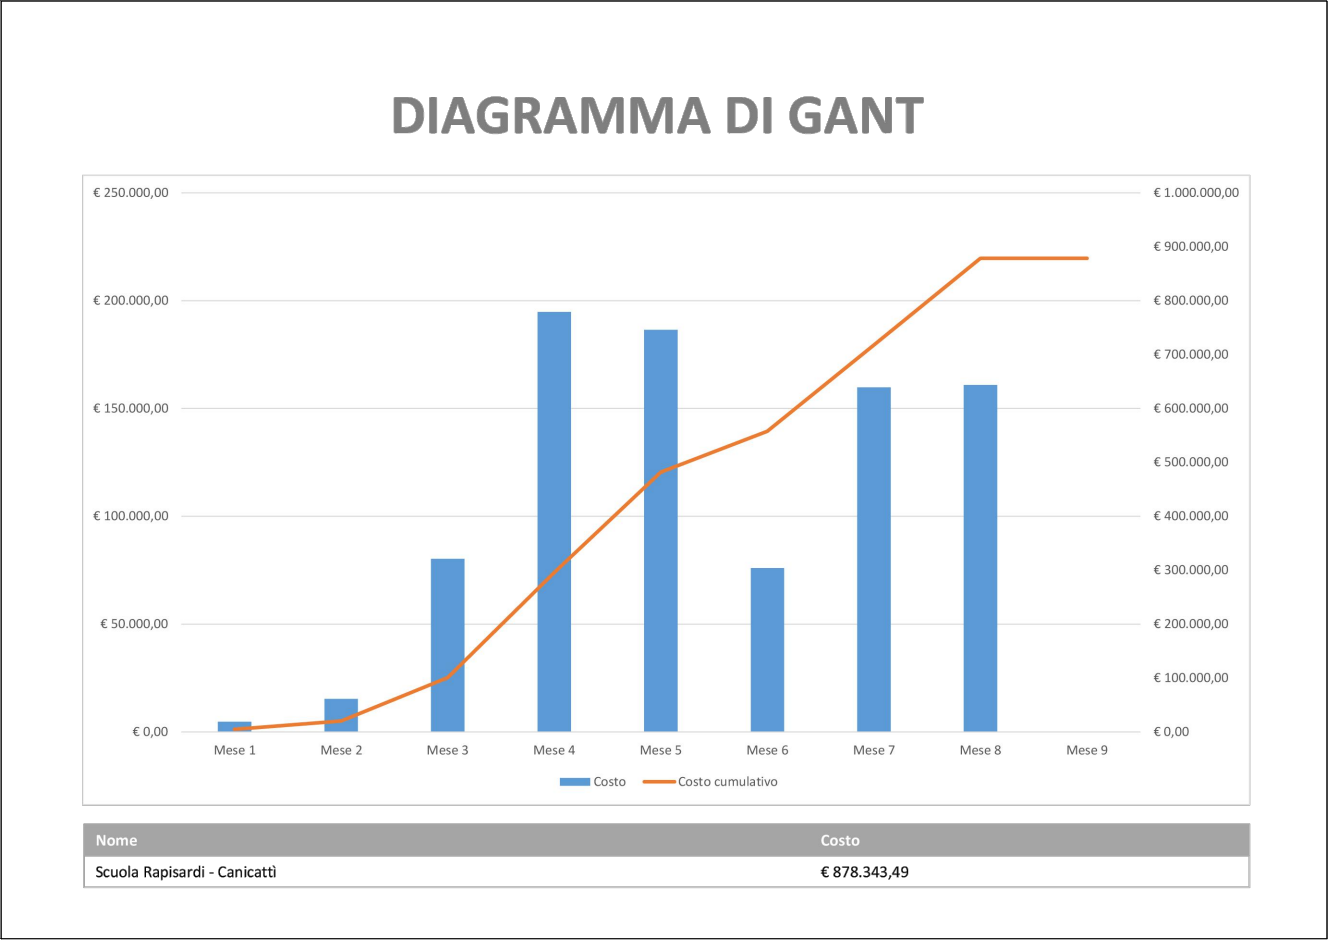

COMUNE DI CANICATTI'
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

OGGETTO:

PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI "COMPLETAMENTO, SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA RAPISARDI" - CUP: **PROV0000057869**

PROGETTO ESECUTIVO

Codice elaborato	Titolo elaborato
9.3	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO Cronoprogramma
Nome file: 9.3.PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO Cronoprogramma.dwg	Scale: -

Approvazioni / Validazioni:					
B					
A	EMISSIONE	OTTORRE 2025			
REV.	DESCRIZIONE	DATA	VERIFICATO	CONTROLLATO	APPROVATO

IL PROGETTISTA:

ING. LUIGI DI NATALI

Firmato digitalmente da:
Di Natali Luigi
Data: 2025.11.10
12:49:57 +01'00'

IL RUP:

GEOM. ANTONIO LA VECCHIA
C/DE L'INGEGNERIA DI CANTIERI

Firmato digitalmente da:
Antonio La Vecchia
Firmato il 14/05/2026 10:02
Data: 2026.05.14 10:02:00
140675234 - 170640000
140675234 - 170640000

COLLABORATORI RUP:

GEOM. DIEGO SFALANGA
C/DE L'INGEGNERIA DI CANTIERI

GEOM. GIOACCHINO NICOSIA
C/DE L'INGEGNERIA DI CANTIERI
