



CITTÀ DI CANICATTÌ

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Lavori di rigenerazione urbana di via Cappuccini e Piazza La Lomia

CUP PROV0000057542

ELABORATO

21

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA
03.08


SCALA

CRONOPROGRAMMA

DATA

15/06/ 2026

Progetto verificato ai sensi del D.Lgs. n. 36 del 2023
con Verbale n. 12 del 25 GIU. 2026

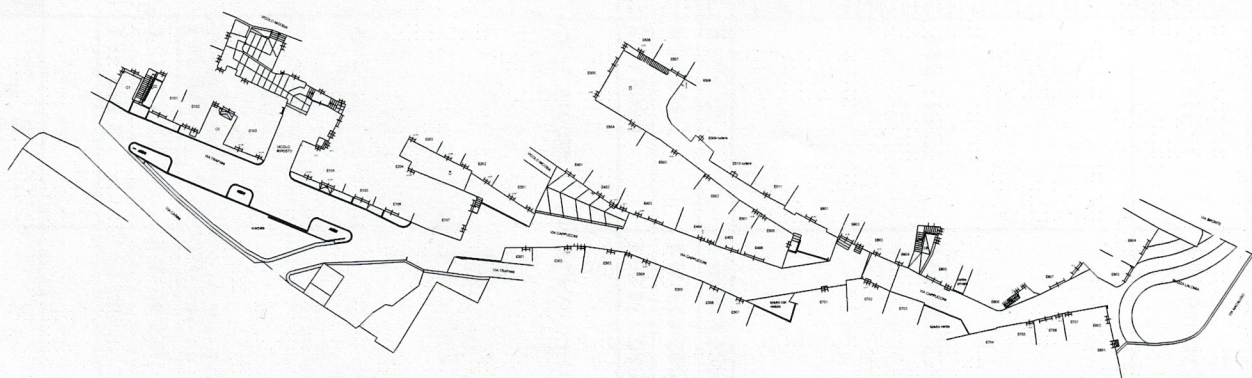

IL PROGETTISTA



Collaboratori del RUP

Geom. Diego Sfalanga

Geom. Giacchino Nicosia

IL RUP

Geom. Giuseppe Cipollina

	LAVORI	GG	Tratto viaTrapani										Tratto via Cappuccini										Piazza Lalomia									
	totale giorni	240	244.114,89 €										334.550,52 €										95.980,93 €									
tratto via Trapani	SICUREZZA	3																														
	DEMOLIZIONI	4																														
	SOTTOSERVIZI	3																														
	RICOSTRUZIONI	60																														
	ARREDO	10																														
tratto via Cappuccini	SICUREZZA	3																														
	DEMOLIZIONI	4																														
	SOTTOSERVIZI	3																														
	RICOSTRUZIONI	85																														
	ARREDO	10																														
Piazza Lalomia	SICUREZZA	3																														
	DEMOLIZIONI	4																														
	SOTTOSERVIZI	3																														
	RICOSTRUZIONI	35																														
	ARREDO	10																														
Importo dei lavori per fase per giorni			4.648,25 €	11.872,15 €	2.578,54 €	200.697,64 €						24.318,31 €	2.032,21 €	11.766,35 €	2.578,54 €	288.661,18 €						29.512,24 €	1.508,64 €	2.319,66 €	322,34 €	75.513,84 €						16.316,45 €
Importo progressivo dei lavori			4.648,25 €	16.520,40 €	19.098,94 €	219.796,58 €						244.114,89 €	246.147,10 €	257.913,45 €	260.491,99 €	549.153,17 €						578.665,41 €	580.174,05 €	582.493,71 €	582.816,05 €	658.329,89 €						674.646,38 €
avanzamento in percentuale per lavoro			0,69	2,45	2,83	32,58						36,18	36,49	38,23	38,61	81,40						85,77	85,74	86,09	86,13	97,58						100,00
